
Cronograma del proyecto

Sistema de Gestión de Producción y Venta de Pollos de Engorde · Bases de Datos 2 · Universidad El Bosque · Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Equipo Los Pollos Hermanos: Dylan Mancipe (DM), gerente y experto del negocio · Juan Diego López (JDL), líder de base de datos e infraestructura · Gabriela Poveda (GP), líder de frontend, calidad y documentación

Periodo: 22/10/2026 – 11/11/2026 (entrega del proyecto) · Sustentación: jueves 19/11/2026

ID	Tarea / entregable	Resp.	Planeado	Real
GESTIÓN DEL PROYECTO				
1	**Gestión del proyecto**	DM	22/10 – 11/11	**22/10 – 11/11**
1.1	Acta de constitución	Equipo	22/10	**22/10**
1.2	Documentos de gestión	GP	23/10 – 29/10	**23/10 – 29/10**
FASE 1 · DISEÑO Y MODELADO				
2	**Fase 1: diseño y modelado**	JDL	23/10 – 30/10	**23/10 – 10/11**
2.1	Propuesta y supuestos (actualizada)	DM	23/10 – 26/10	**23/10 – 26/10**
2.2	Modelos E-R (Chen, Crow's Foot) y relacional	JDL	26/10 – 29/10	**26/10 – 29/10**
2.3	Diccionario de datos	GP	28/10 – 30/10	**28/10 – 30/10**
2.4	Documento SQL de reportes	GP	29/10 – 30/10	**29/10 – 10/11**
FASE 2 · IMPLEMENTACIÓN (8 INCREMENTOS)				
3	**Fase 2: implementación**	Equipo	01/11 – 09/11	**01/11 – 10/11**
3.1	Inc. 1: base del proyecto	JDL	01/11	**01/11**
3.2	Inc. 2: seguridad, usuarios, roles y permisos	DM, JDL / GP	01/11 – 02/11	**01/11**
3.3	Inc. 3: galpones, lotes y catálogos	DM / GP	02/11 – 03/11	**02/11**
3.4	Inc. 4: personal, proveedores, alimentación y sanidad	JDL / GP	03/11 – 04/11	**02/11**
3.5	Inc. 5: gastos, beneficio, clientes, pedidos y ventas	DM, JDL / GP	04/11 – 06/11	**03/11 – 07/11**
3.6	Inc. 6: portal de clientes y pago en línea	DM, JDL / GP	05/11 – 07/11	**03/11 – 08/11**
3.7	Inc. 7: seguimiento en MongoDB y auditoría	DM, JDL / GP	07/11 – 08/11	**08/11 – 09/11**
3.8	Inc. 8: instalación, despliegue y documentación	JDL, DM / GP	08/11 – 09/11	**09/11 – 10/11**
3.9	VM, PostgreSQL y MongoDB instalados	JDL	30/10 – 31/10	**30/10 – 31/10**
3.10	Entrega del código (develop → main)	Equipo	09/11	**09/11**
CIERRE				
4	Pruebas integrales	GP	10/11	**10/11**
5	Documentos de Fase 2 (SO, RDBMS) e informe ejecutivo	GP	05/11 – 11/11	**10/11 – 11/11**
6	Video demostrativo	Equipo	10/11	**11/11**
7	Sustentación	Equipo	19/11	**Programada**

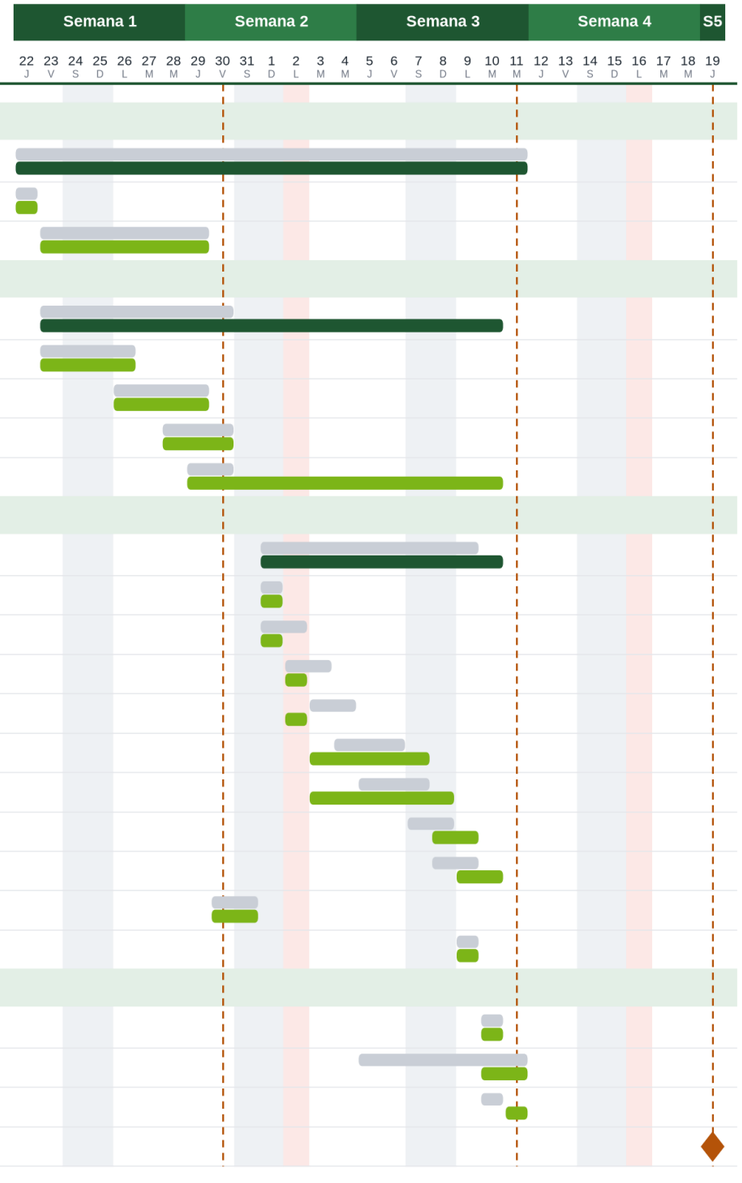

Planeado · Real · Real (tarea resumen) · Fin de semana · Festivo (2 y 16 nov) · - - - Hitos: entrega Fase 1 (30/10), entrega del proyecto (11/11) y sustentación (19/11)

Real: primer commit y merge de cada PR en GitHub (pollos_hermanos_back y pollos_hermanos_front_dos), hora de Colombia. Después de la entrega del 11/11/2026 solo queda la sustentación del 19/11/2026.

Hitos y entregables parciales

Hito	Fecha planeada	Fecha real	Variación (días)	Entregable / evidencia
Documentos de gestión (metodología, requerimientos, cronograma, RACI, riesgos)	29/10/2026	29/10/2026	0	Documentos 1 a 5
Entrega Fase 1: modelos, diccionario de datos y SQL de reportes	30/10/2026	10/11/2026	11	Modelos E-R, relacional, diccionario, 07_SQL_Reportes.sql
Máquinas virtuales, PostgreSQL y MongoDB instalados	31/10/2026	31/10/2026	0	VM rufus (Ubuntu 26.04 Desktop mínima, PostgreSQL 18) y srv-lemp (Ubuntu 26.04 Server, MongoDB 7.0)
Scripts de creación, inserción y lógica en PL/pgSQL	09/11/2026	09/11/2026	0	sql/modulo_00 a modulo_11 (PR #2 a #7 back; en main con PR #9)
Implementación de MongoDB	08/11/2026	08/11/2026	0	PR #7 seguimiento-auditoria (back)
Aplicación web integrada con ambas bases y la pasarela	09/11/2026	09/11/2026	0	PR #9 develop → main (back y front)
Pruebas integrales	10/11/2026	10/11/2026	0	183 pruebas SQL y 205 JUnit; pruebas de punta a punta
Video demostrativo	10/11/2026	11/11/2026	1	Video de máx. 15 min
Entrega Fase 2 e informe ejecutivo	11/11/2026	11/11/2026	0	Documentos 6, 8 y 9
Sustentación	19/11/2026	Programada	—	—

Variación negativa = adelanto frente al plan. Real: primer commit y merge de cada PR en GitHub (repositorios pollos_hermanos_back y pollos_hermanos_front_dos), hora de Colombia. Fase 2 en 8 incrementos, cada uno con su rama feature/* y su PR aprobado por otro integrante (salvo el PR #1 del frontend). Después de la entrega del 11/11/2026 solo queda la sustentación del 19/11/2026.
